



रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिले वि.स. २०८० आश्विन महिनामा गरेको
आयोजना अनुगमनको प्रतिवेदन

जम्मा आयोजना अनुगमन संख्या: ५ वटा,

अनुगमन दिन ३



<p>योजनाको विवरण</p>	<p>आयोजनाको नाम: मनसुन जन्य विपद् घर निर्माण अनुगमन गरेको मिति: २०८०/०६/०४ योजना निर्माणस्थल: रुरुक्षेत्र ३ लाभग्राहिको नामथर: हिमकला नेपाली निर्माण सम्झौता मिति: २०७९/०९/१२९ भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: ५०% कुल पाउने रकम: ४,००,०००/- हालसम्म पाएको रकम: २,००,०००/- बाँकी रकम: २,००,०००/-</p>	<p>अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीहरू मिनादेवी गौतम —संयोजक लक्ष्मण पाण्डे-सदस्य हरि प्रसाद ज्ञवाली-सदस्य राज कुमारी शाही-सदस्य मिलन श्रेष्ठ —सदस्य रुद्रहरि पुरी-सदस्य सचिव <u>आमन्त्रित</u> यदु ज्ञवाली: अध्यक्ष मोहन अर्याल: विपद् फोकल पर्सन (सब इन्जिनियर) नारायण थापा: सब इन्जिनियर</p>
<p>अनुगमन समितिको निर्णय</p>	<p>रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. ३ लोलेंगखोला अन्तरगत मनसुन जन्य विपद् मा घर पूर्णनिर्माणको लागि लाभग्राही कायम भई निजि घर निर्माणको लागि सम्झौता गरेको लाभग्राही श्री हिमकला नेपालीले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको हुँदा नियमानुसार पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, तम्घास, गुल्मीमा पठाउने निर्णय गरियो ।</p>	

आयोजनाका फोटोहरू:

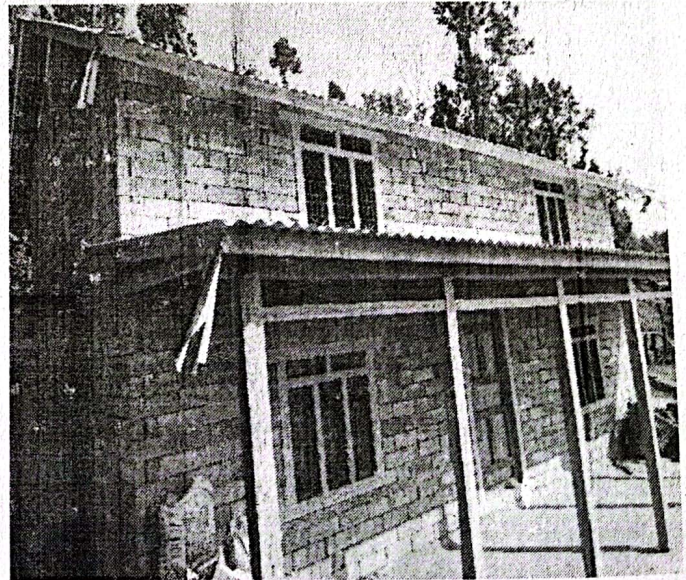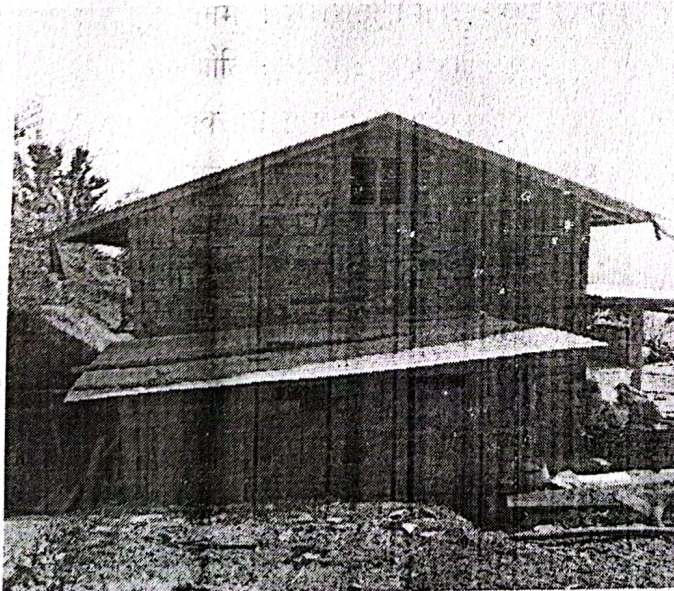


<p>योजनाको विवरण</p>	<p>आयोजनाको नाम: मनसुन जन्य विपद् घर निर्माण अनुगमन गरेको मिति: २०८०/०६/०४ योजना निर्माणस्थल: रुरुक्षेत्र ४, वलेटक्सार, गुल्मी लाभग्राहिको नामथर: पुष्पलाल श्रेष्ठ निर्माण सम्झौता मिति: २०७९/१२/१५ भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: ५०% कुल पाउने रकम: ४,००,०००/- हालसम्म पाएको रकम: २,००,०००/- बाँकी रकम: २,००,०००/-</p>	<p>अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीहरू मिनादेवी गौतम —संयोजक लक्ष्मण पाण्डे-सदस्य हरि प्रसाद जवाली-सदस्य राज कुमारी शाही-सदस्य मिलन श्रेष्ठ —सदस्य रुद्रहरि पुरी-सदस्य सचिव आमन्त्रित यदु जवाली: अध्यक्ष मोहन अर्याल: विपद् फोकल पर्सन (सब इन्जिनियर) नारायण थापा: सब इन्जिनियर</p>
<p>अनुगमन समितिको निर्णय</p>	<p>रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. ४ वलेटक्सार अन्तरगत मनसुन जन्य विपद् मा घर पूर्णनिर्माणको लागि लाभग्राही कायम भई निजि घर निर्माणको लागि सम्झौता गरेको लाभग्राही श्री पुष्पलाल श्रेष्ठले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको हुँदा नियमानुसार पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, तम्घास, गुल्मीमा पठाउने निर्णय गरियो ।</p>	

आयोजनाका फोटोहरू:

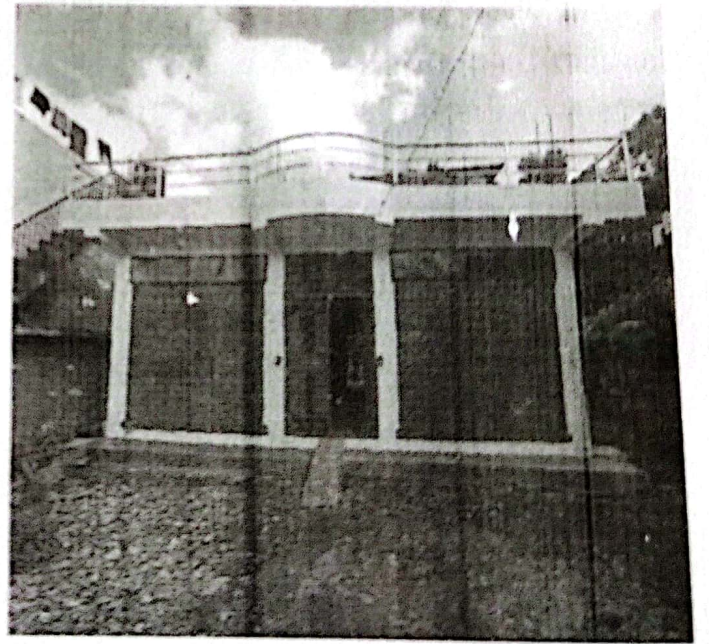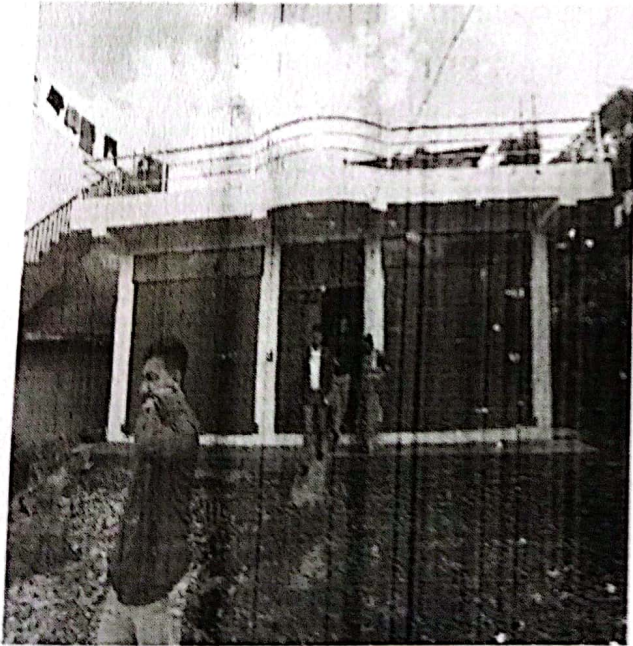

<p>योजनाको विवरण</p>	<p>आयोजनाको नाम: मनसुन जन्य विपद् घर निर्माण अनुगमन गरेको मिति: २०८०/०६/०४ योजना निर्माणस्थल: रुरुक्षेत्र ४, बलेटक्सार, गुल्मी लाभग्राहिको नामथर: हेम कुमार गौतम निर्माण सम्झौता मिति: भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: ५०% कुल पाउने रकम: ४,००,०००/- हालसम्म पाएको रकम: २,००,०००/- बाँकी रकम: २,००,०००/-</p>	<p>अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीहरू मिनादेवी गौतम —संयोजक लक्ष्मण पाण्डे-सदस्य हरि प्रसाद ज्ञवाली-सदस्य राज कुमारी शाही-सदस्य मिलन श्रेष्ठ —सदस्य रुद्रहरि पुरी-सदस्य सचिव <u>आमन्त्रित</u> यदु ज्ञवाली: अध्यक्ष मोहन अर्याल: विपद् फोकल पर्सन (सब इन्जिनियर) नारायण थापा: सब इन्जिनियर</p>
<p>अनुगमन समितिको निर्णय</p>	<p>रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. ४ बलेटक्सार अन्तरगत मनसुन जन्य विपद् मा घर पूर्णनिर्माणको लागि लाभग्राही कायम भई निजि घर निर्माणको लागि सम्झौता गरेको लाभग्राही श्री हेम कुमार गौतमले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको हुँदा नियमानुसार पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, तम्घास, गुल्मीमा पठाउने निर्णय गरियो ।</p>	


आयोजनाका फोटोहरू:

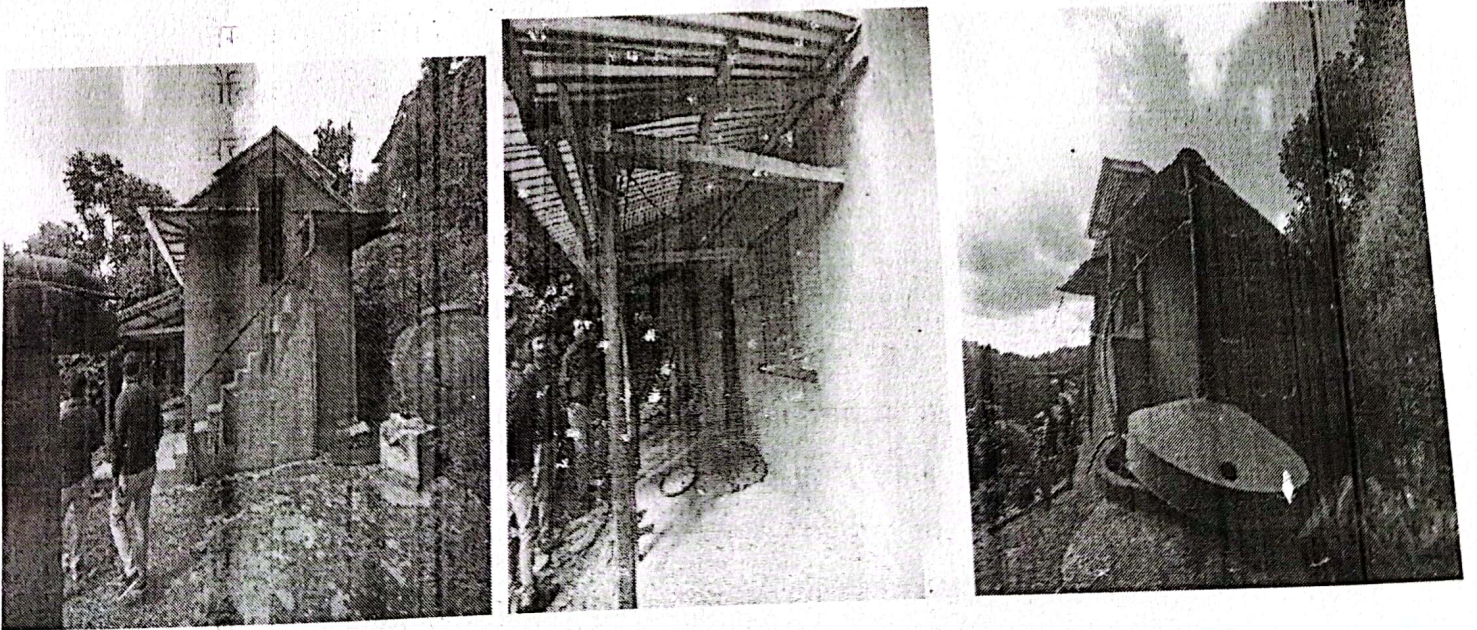



योजनाको विवरण	आयोजनाको नाम: मनसुन जन्य विपद् घर निर्माण अनुगमन गरेको मिति: २०८०/०६/०५ योजना निर्माणस्थल: रुरुक्षेत्र ६, रिमुवा, गुल्मी लाभग्राहिको नामथर: देव बहादुर दर्लामी निर्माण सम्झौता मिति: २०७९/०९/१४ भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: ५०% कुल पाउने रकम: ४,००,०००/- हालसम्म पाएको रकम: २,००,०००/- बाँकी रकम: २,००,०००/-	अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीहरू मिनादेवी गौतम —संयोजक लक्ष्मण पाण्डे-सदस्य हरि प्रसाद ज्ञवाली-सदस्य राज कुमारी शाही-सदस्य मिलन श्रेष्ठ —सदस्य रुद्रहरि पुरी-सदस्य सचिव <u>आमन्त्रित</u> यदु ज्ञवाली: अध्यक्ष मोहन अर्याल: विपद् फोकल पर्सन (सब इन्जिनियर) नारायण थापा: सब इन्जिनियर
अनुगमन समितिको निर्णय	रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. ४ जलेटक्सार अन्तरगत मनसुन जन्य विपद् मा घर पूर्णनिर्माणको लागि लाभग्राही कायम भई निजि घर निर्माणको लागि सम्झौता गरेको लाभग्राही श्री देव बहादुर दर्लामीले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको हुँदा नियमानुसार पाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, तम्घास, गुल्मीमा पठाउने निर्णय गरियो ।	

आयोजनाका फोटोहरू:

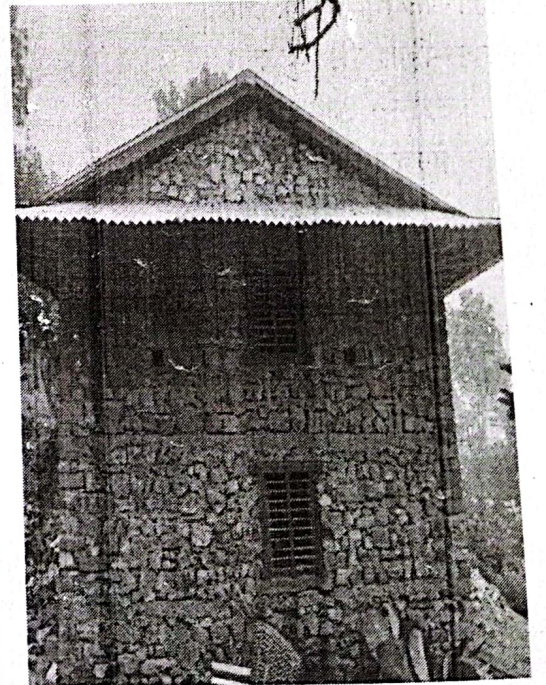

<p>योजनाको विवरण</p>	<p>आयोजनाको नाम: Construction of Jaggery Processing Center Ward no. ४</p> <p>अनुगमन गरेको मिति: २०८०/०६/२४</p> <p>योजना निर्माणस्थल: रुरुक्षेत्र ४</p> <p>निर्माण व्यवसायीको नाम: पनरोमा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स</p> <p>निर्माण सम्झौता मिति: २०८०/०३/११</p> <p>सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०८०/०८/११</p> <p>भौतिक प्रगति: १००%</p> <p>वित्तीय प्रगति: ०%</p> <p>कुल सम्झौता रकम: २५,४८,३१०.१२</p> <p>हालसम्म पाएको रकम: नपाएको</p> <p>बाँकी रकम: २५,४८,३१०.१२</p>	<p>अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीहरू</p> <p>मिनादेवी गौतम —संयोजक</p> <p>लक्ष्मण पाण्डे - सदस्य</p> <p>हरि प्रसाद ज्ञवाली - सदस्य</p> <p>राज कुमारी शाही - सदस्य</p> <p>मिलन श्रेष्ठ - सदस्य</p> <p>रुद्रहरि पुरी - सदस्य सचिव</p> <p><u>आमन्त्रित</u></p> <p>यदु ज्ञवाली: अध्यक्ष</p> <p>मोति प्रसाद श्रेष्ठ: वडा अध्यक्ष</p> <p>रोमाकान्त पाण्डे: अ.स.व.इ</p> <p>मोहन भण्डारी: सब इ</p> <p>दिनेश दर्लामी: अ.स.व.इ</p> <p>कपिल गौतम पत्रकार</p> <p>नारायण के.सी.: नि. व्यवसायी</p> <p>ठाकुर प्रसाद पन्थ: स्थानीय</p> <p>सोम बहादुर नेपाली : स्थानीय</p>
<p>अनुगमन समितिको निर्णय</p>	<p>आ.व. २०७९/०८० मा स्वीकृत बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत Construction of Jaggery Processing Center Ward no. ४ को सम्झौता अनुसारको कार्य निर्माण व्यवसायीले समय भन्दा अगावै सम्पन्न गरेको हुँदा प्राविधिक मुल्यांकन अनुसारको रकम आयोजनामा स्वीकृत रकमबाट भुक्तानी दिन सिफारिस गरिएको ।</p>	

आयोजनाका फोटोहरू

